







امر کشاورزی در کشور ما از اهم امور است.

گزارش مصور اعتبارات پروژه های جهاد کشاورزی استان تهیه کننده: مدیریت برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی

بهار ۱۴۰۴



سیمای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

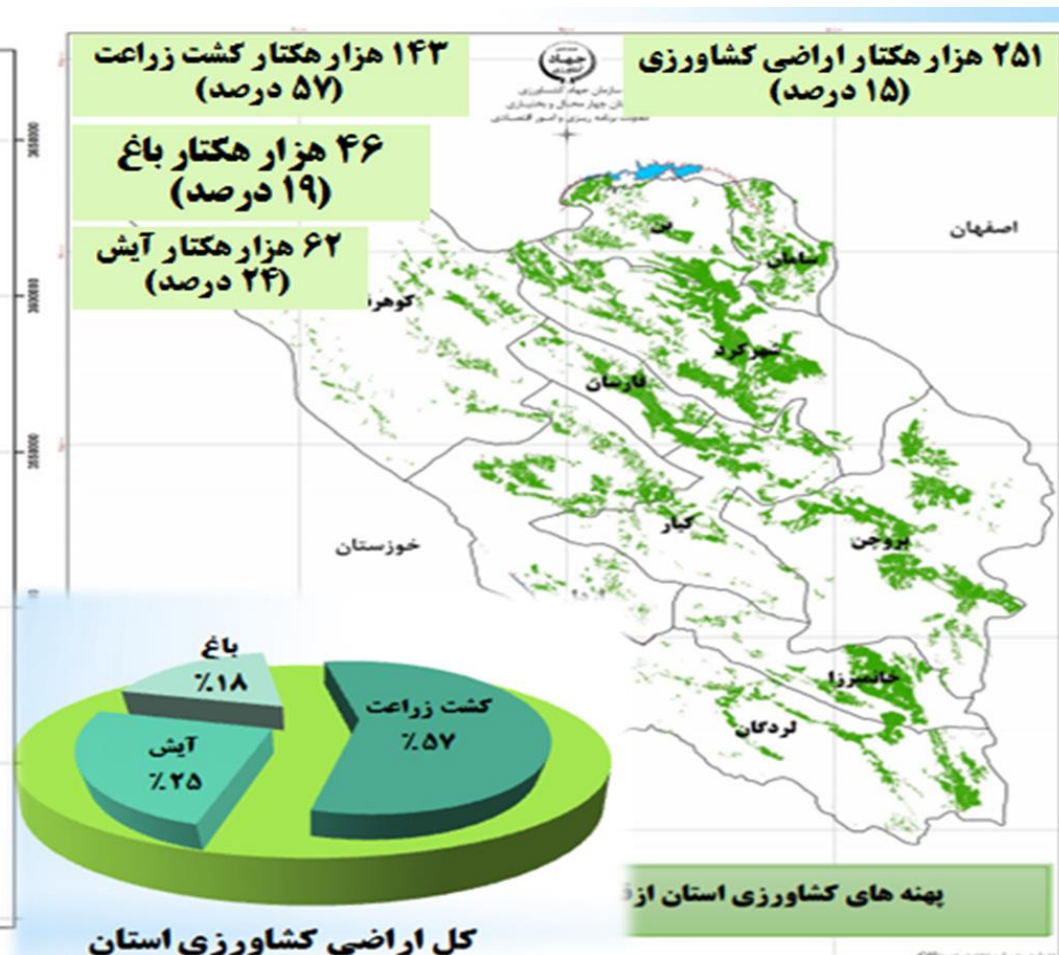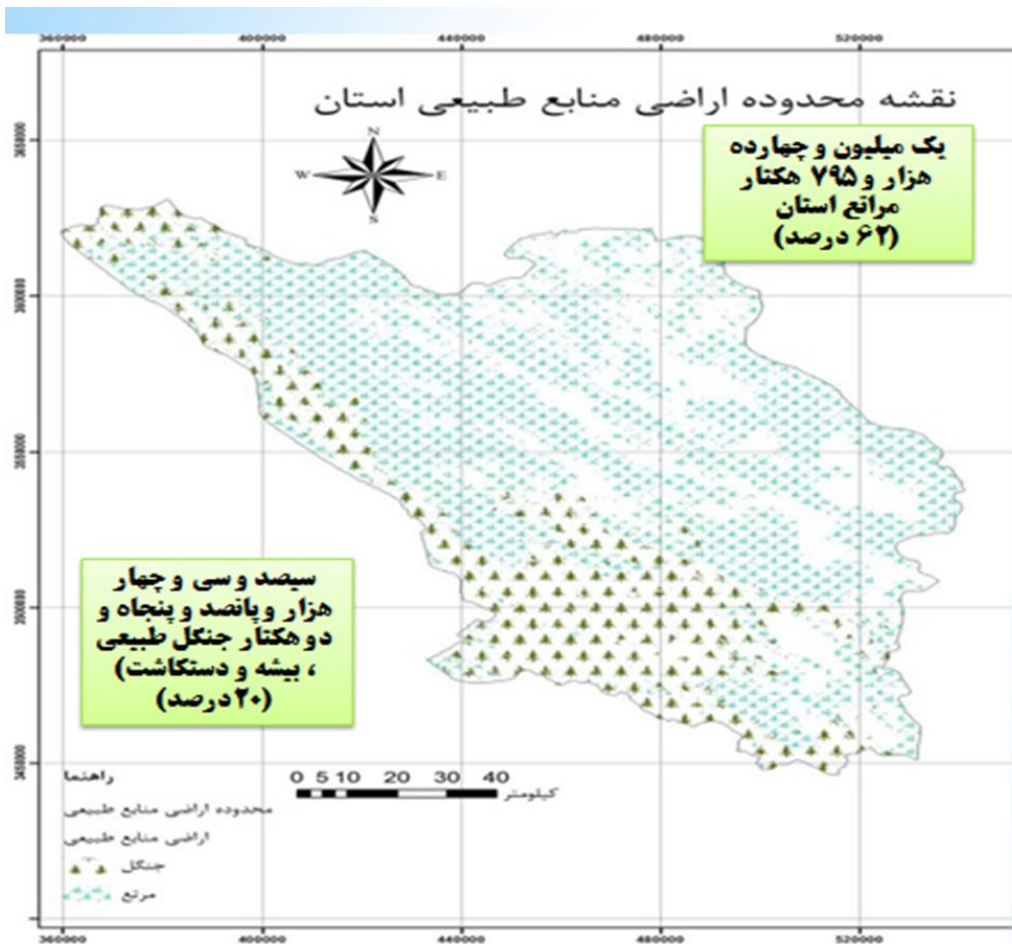

تولیدات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری



برآورده ارزش وزنی تولیدات کشاورزی استان در سال ۱۴۰۲ (هزار تن): حدود ۲۰۳۱ هزارتن

۱. ارزش وزنی تولیدات زراعی: ۱۳۴۴ هزار تن (۶۶,۲ درصد)
۲. ارزش وزنی تولیدات باغی: ۲۵۳ هزارتن (۱۲,۵ درصد)
۳. ارزش وزنی تولیدات دامی: ۳۸۷ هزار تن (۱۹ درصد)
۴. ارزش وزنی تولیدات شیلات و آبزیان: ۲۷ هزار تن (۱,۳ درصد)
۵. گلخانه و سبزی و صیفی: ۱۲ هزار تن (۰,۵ درصد)
۶. قارچ دکمه ای: ۷ هزار تن (۰,۳ درصد)

کل ارزش ریالی تولیدات کشاورزی استان در سال ۱۴۰۱ (میلیارد ریال): ۳۱۶۳۱۱ میلیارد ریال

۱. ارزش ریالی تولیدات زراعی: ۶۴۸۶۱ میلیارد ریال (۲۰ درصد)
۲. ارزش ریالی تولیدات باغی: ۷۹۵۹۸ میلیارد ریال (۲۵ درصد)
۳. ارزش ریالی تولیدات دامی: ۱۴۴۴۷۴ میلیارد ریال (۴۵ درصد)
۴. ارزش ریالی تولیدات شیلات و آبزیان: ۱۹۲۴۵ میلیارد ریال (۰,۶ درصد)
۵. گلخانه و سبزی و صیفی: ۳۵۹۲ میلیارد ریال (۱ درصد)
۶. قارچ دکمه ای: ۳۰۴۲ میلیارد ریال (۱ درصد)

تعداد کل بهره برداران بخش کشاورزی استان بیش از ۸۳ هزار

بهره بردار می باشد.

وضعیت شاخص های کلان اقتصادی بخش کشاورزی استان

سهم ارزش تولیدات بخش کشاورزی کشور نسبت به کل تولید ناخالص کشور:
۸/۴٪

سهم تولید ناخالص داخلی استان از کل تولید ناخالص داخلی کشور:
۰/۶۵٪

سهم تولیدات کشاورزی استان از ارزش تولیدات کشاورزی کشور:
۱/۶٪

سهم تولیدات کشاورزی استان از تولید ناخالص داخلی استان:
۲۱٪




ردیف	شرح	ارقام (میلیارد ریال)
۱	تولید ناخالص داخلی کشور	۱۷,۷۳۹,۵۵۷
۲	ارزش تولیدات بخش کشاورزی کشور	۱,۴۹۰,۶۸۳
۳	تولید ناخالص داخلی استان	۱۱۶,۰۸۹
۴	تولیدات کشاورزی استان	۲۳۱,۹۲۲

بر اساس گزارش بانک جهانی اگر سهم کشاورزی در GDP یک منطقه بیش از ۱۵٪ باشد اقتصاد کشاورزی محور دارد.


میزان سهم بری اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای استانی سازمان از سرجمع اعتبارات مصوب
جدول ج - ۱۰ قوانین بودجه سنوات

هزینه ای استانی متوازن ۲ متوازن استانی نفت و گاز سرمایه استانی

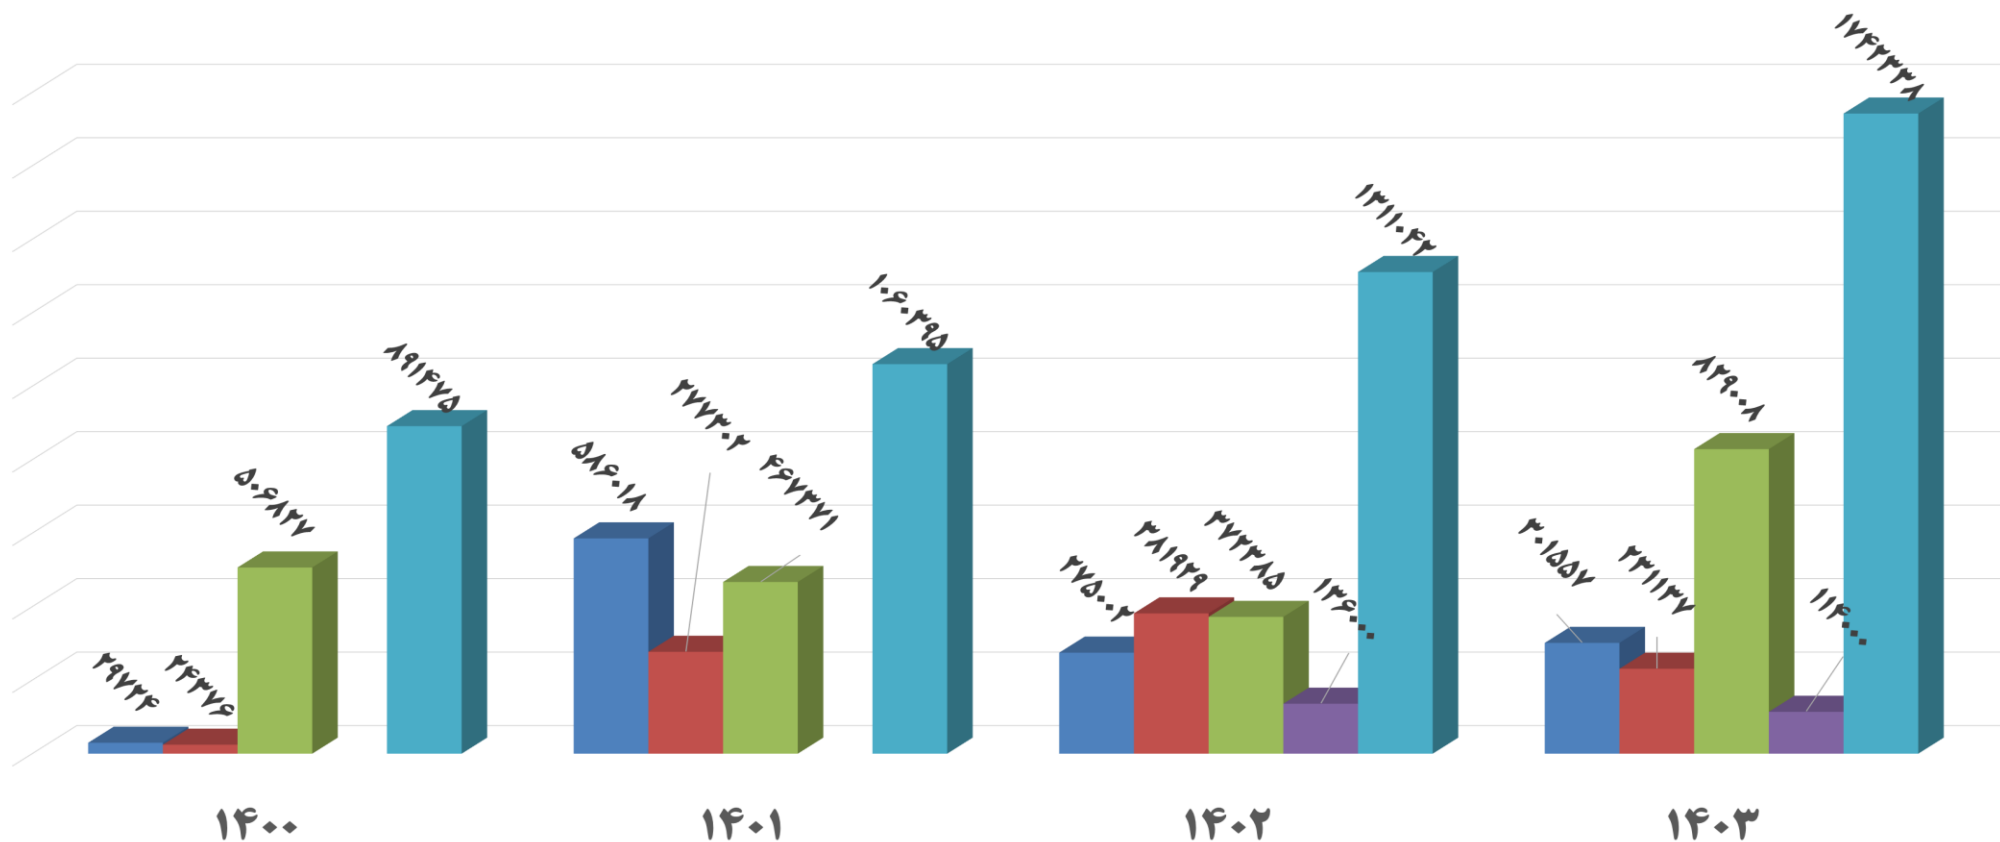

میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای استانی سازمان از سرجمع اعتبارات مصوب
جدول ج - ۱۰ قوانین بودجه سنوات

هزینه ای استانی متوازن ۲ متوازن استانی نفت و گاز سرمایه استانی

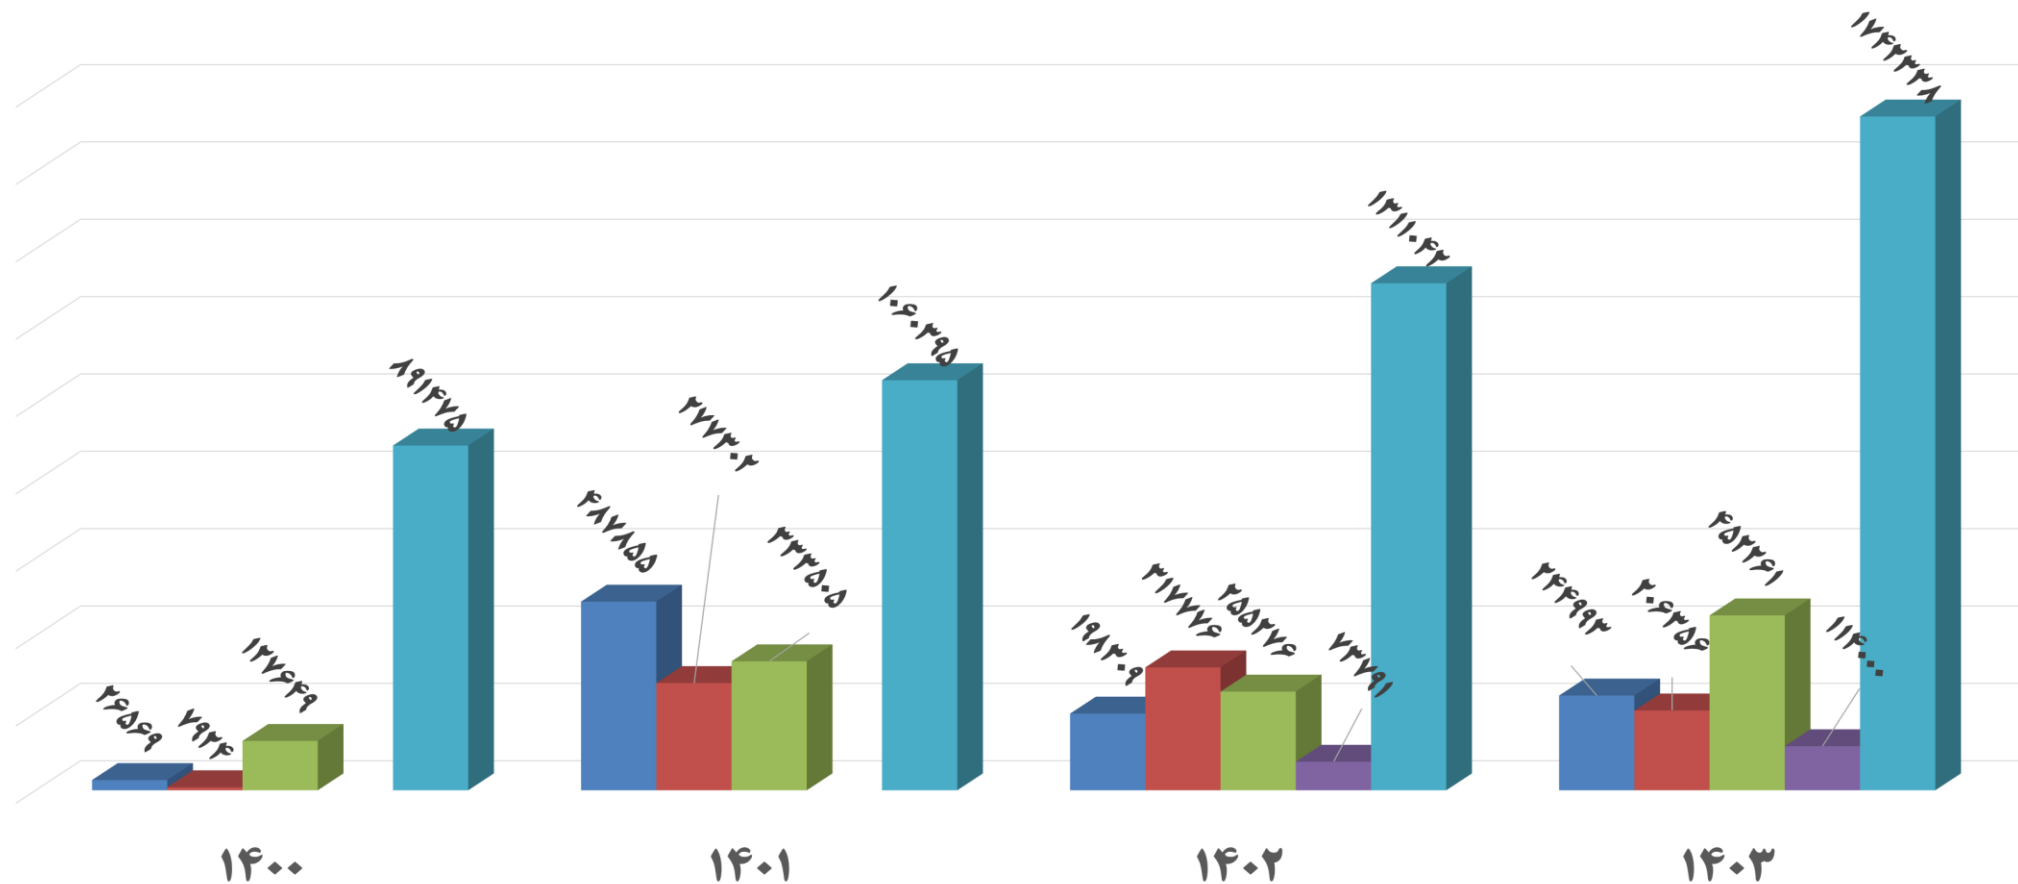


روکش طرح های تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری (اعتبار به میلیون ریال)

ردیف	عنوان پروژه	کد پروژه	محل اجرا	سطح	دبی	سال شروع	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده برنامۀ ششم	پیشرفت فیزیکی (درصد)	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل
				(هکتار)	لیتر بر ثانیه						
۱	اجرای شبکه آبیاری اراضی زیر دست سد بیدکان	۹۴۰۴۳۴	شهرکرد	۲۷۰۰	۱۳۰۰	۱۳۹۲	۰	۹۱۶,۷۸۴	۳۰	۳۲۵۹۷	۴۰۰,۰۰۰
۲	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی دوراهان	۹۶۰۲۰۸	بروجن	۴۰۰	۱۹۴	۱۳۸۶	۰	۳۳۲,۲۵۱	۷۰	۳۹,۹۲۶	۳۰۰,۰۰۰
۳	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی سرقلعه، انجو و شملک	۹۳۰۳۳۵	لردگان	۲۲	۹	۱۴۰۱	۱,۶۰۰	۶۳,۸۰۲	۷۰	۳۰,۵۴۸	۵۰,۰۰۰
۴	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی جهمان	۴۰۱۰۰۹۲	کیار	۱۲۵	۵۰	۱۴۰۱	۰	۵۰,۳۶۵	۳۰	۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی دره کله گرد ناغان	۹۵۰۲۶۷	کیار	۲۵	۱۰	۱۳۹۶	۰	۳۶,۰۲۰	۳۰	۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۶	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی دهنو کیار	۹۶۰۲۰۰	کیار	۲۲۷	۶۰	۱۳۹۸	۰	۳۵,۱۵۵	۳۰	۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی سرتنگ لاغر	۹۴۰۰۳۳	کیار	۱۷۰	۷۰	۱۳۹۶	۲۵۰	۱۰۸,۳۸۳	۸۰	۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۸	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی گاونوت	۹۵۰۰۵۶	کیار	۳۵۰	۱۹۳	۱۳۹۰	۰	۱۷۵,۷۵۵	۸۵	۷۲۸۹	۴۰۰,۰۰۰
۹	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی کوهکانک	۹۰۰۹۲۴	کوهرنگ	۱۴۰	۸۰	۱۳۹۲	۳,۳۰۸	۳۲,۴۸۳	۵۰	۱۱,۱۹۵	۵۰,۰۰۰
۱۰	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی گزستان	۹۴۰۴۳۲	کوهرنگ	۱۲۵	۱۱۵	۱۳۹۴	۱,۱۰۱	۳۸,۳۰۰	۷۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۱	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی مالک آباد	۹۶۰۵۲۸	کوهرنگ	۱۲۵	۷۷	۱۳۹۷	۰	۵۹,۵۰۰	۳۰	۱۱,۹۳۹	۶۰,۰۰۰
۱۲	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی بوگر	۹۴۰۴۲۷	خانمیرزا	۲۵۰	۱۲۰	۱۳۹۰	۰	۱۳۶,۶۱۱	۸۰	۱۲,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰
۱۳	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی گرداب سفلی	۹۶۰۲۲۱	فلارد	۳۰۰	۱۸۵	۱۳۸۸	۰	۹۹,۹۷۷	۸۰	۱۱,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴	تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی سرچاه و دوازده امام	۹۳۰۳۲۷	اردل	۶۰۰	۳۶۶	۱۳۹۰	۴,۰۰۰	۱۲,۱۸۸	۲۰	۲۱,۸۲۲	۷۰۰,۰۰۰
جمع											
							۱۰,۲۵۹	۲,۰۹۷,۵۷۴		۱۹۴۶۶۵	۳,۴۱۰,۰۰۰

۱- اجرای شبکه آبیاری اراضی زیر دست سد بیدکان

محل اجرا	بخش لاران شهرستان شهرکرد
مساحت طرح	۲۷۰۰ هکتار
کاربری	کشاورزی
میزان آب	۱۳۰۰ لیتر بر ثانیه
تعداد بهره بردار	۲۰۰۰ خانوار
طول خط انتقال	۵۵۰۰ متر
تعداد ایستگاه های پمپاژ	-
مختصات جغرافیایی محل آبگیری	X:454559 Y:3580291
سال شروع پروژه :	۱۳۹۲
پیشرفت فیزیکی	۳۰ درصد
ارتفاع کل پمپاژ	-
شیوه آبگیری:	اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و آبرسانی به اراضی پایاب سد بیدکان

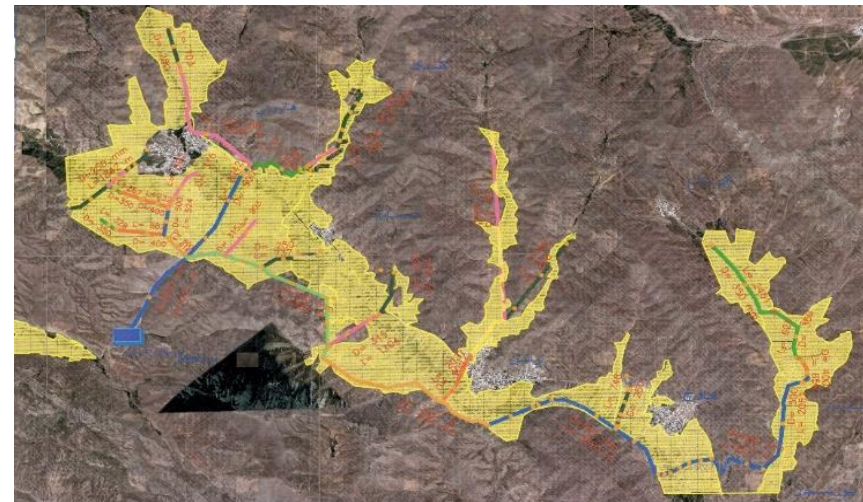

کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۴۰۴۳۴	۰	۹۱۶۷۸۴	۳۲۵۹۷	۴۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

خرید و اجرای ۱۰ کیلومتر از لوله های خط انتقال

عملیات اجرایی باقی مانده:

تکمیل خرید و اجرای ۴۵ کیلومتر لوله های خط انتقال



۲- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی روستای دوراهان

محل اجرا	روستای دوراهان شهرستان بروجن					
مساحت طرح	۴۰۰ هکتار					
کاربری	کشاورزی					
میزان مجوز آب	۱۹۴ لیتر بر ثانیه					
تعداد بهره بردار	۳۵۰ خانوار					
طول خط انتقال	۷۹۲۴ متر					
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۲ ایستگاه					
مختصات جغرافیایی محل آبرگیری	X=519755 Y=3491903					
سال شروع پروژه:	۱۳۸۶					
پیشرفت فیزیکی	۷۰ درصد					
ارتفاع کل پمپاژ	۴۲۵ متر					
شیوه آبرگیری: احداث بند آبرگیری						
مشخصات ایستگاه پمپاژ						
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ
ایستگاه شماره یک	۵۳۰	۵۰۰-۶۰۰	۱۹۴	۶/۳۳۷	۳۵۵	۳+۱
ایستگاه شماره دو	۲۷۰	۴۰۰-۵۰۰	۱۹۴	۴/۸۷	۳۵۵	۲+۱



عملیات اجرایی انجام شده:

احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ
خرید و اجرای لوله های خط انتقال
خرید و نصب لوازم مکانیکال و الکتریکال
ساخت حوضچه های شیرآلات مسیر انتقال آب

عملیات اجرایی باقی مانده:

تکمیل خرید و نصب لوازم مکانیکال و الکتریکال
خرید امتیاز برق و اجرای شبکه برق
تکمیل استخر
تکمیل خط انتقال آب



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۳۰۳۳۵	۱۶۰۰	۶۳۸۰۲	۳۰۵۴۸	۵۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

عملیات اجرایی باقی مانده:

احداث چاهک دهانه گشاد به صورت جذبی
احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ
خرید و اجرای لوله های خط انتقال
اجرای جاده دسترسی
احداث گالری
احداث حوضچه انتهایی

اجرای دیوار ساحلی
تکمیل حوضچه انتهایی و چاهک مکش
خرید امتیاز برق و اجرای شبکه برق
احداث اتاقک
استخر ذخیره آب
اجرای خط لوله گذاری
نصب لوازم الکتریکی و مکانیکال



۳- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی سرقلعه، انجو و شملک

محل اجرا	روستای شملک شهرستان لردگان
مساحت طرح	۲۲ هکتار
کاربری	کشاورزی
میزان مجوز آب	۹ لیتر بر ثانیه
تعداد بهره بردار	۲۰ خانوار
طول خط انتقال	۱۵۰ متر
تعداد ایستگاه پمپاژ	۱ ایستگاه
مختصات جغرافیایی محل آبیگری	X:465364 Y:3476701
سال شروع پروژه:	۱۴۰۱
پیشرفت فیزیکی	۷۰ درصد
ارتفاع کل پمپاژ	۱۰۰ متر

شیوه آبیگری: جذبی


مشخصات ایستگاه پمپاژ

نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۱۵۰	۱۵۰	۹	۱۰۰	شناور توربینی	۱	۳۲



۴- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی جهمان

محل اجرا	روستای جهمان شهرستان کیار						
مساحت طرح	۱۲۵ هکتار						
کاربری	کشاورزی						
میزان مجوز آب	۵۰ لیتر بر ثانیه						
تعداد بهره بردار	۵۰ خانوار						
طول خط انتقال	۲۶۰۰ متر						
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۱ ایستگاه						
مختصات جغرافیایی محل آبگیری	X:472455 Y:3529843						
سال شروع پروژه :	۱۴۰۱						
پیشرفت فیزیکی	۳۰ درصد						
ارتفاع کل پمپاژ	۲۳۸ متر						
شیوه آبگیری: آبگیری بصورت مستقیم با کانال و حوضچه رسوبگیر (طول کانال ۳۵۰ متر)							
مشخصات ایستگاه پمپاژ							
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۲۶۰۰	۲۵۰	۵۰	۲۳۸	شناور	۲	۲۲۰

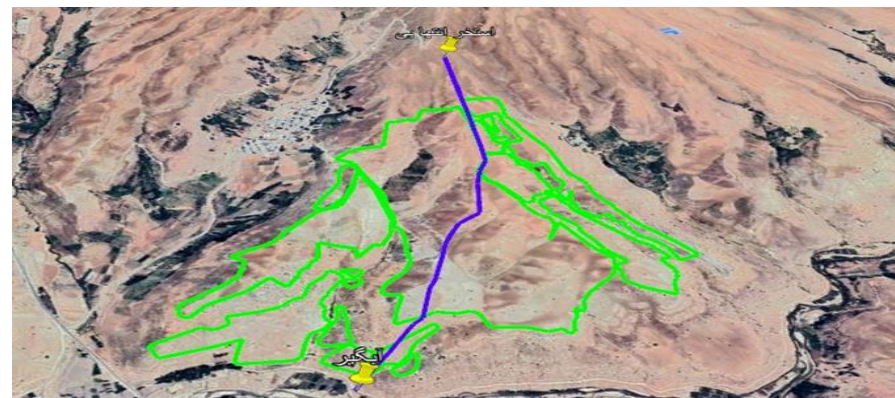

کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۴۰۱۰۰۹۲	۰	۵۰۳۶۵	۲۵۰۰	۲۰۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

خرید و اجرای لوله های فولادی و پلی اتیلن به سایز ۲۵۰ میلی متر حدود ۲۵۰۰ متر
خرید ترانس برق
خرید امتیاز برق

عملیات اجرایی باقی مانده:

اجرای آبگیر
احداث حوضچه شیرآلات
تکمیل خط انتقال
احداث استخر ذخیره آب
تامین و نصب لوازم مکانیکال و الکتریکال
تکمیل شبکه برق، احداث اتاقک پمپاژ



۵- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی دره کله گرد ناغان

محل اجرا	دره کله گرد شهرستان کیار						
مساحت طرح	۲۵ هکتار						
کاربری	کشاورزی						
میزان مجوز آب	۱۰ لیتر بر ثانیه						
تعداد بهره بردار	۱۲۰ خانوار						
طول خط انتقال	۲۸۰۰ متر						
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۱ ایستگاه						
مختصات جغرافیایی محل آبگیری	X:469549 Y:3533856						
سال شروع پروژه :	۱۳۹۶						
پیشرفت فیزیکی	۳۰ درصد						
ارتفاع کل پمپاژ	۲۸۳ متر						
شیوه آبگیری: چاهک دهانه گشاد و گالری زیر سطحی به شیوه جذبی							
مشخصات ایستگاه پمپاژ							
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۲۸۰۰	۱۲۵	۱۰	۲۸۳	شناور UQN345-11	۱	۹۲



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۵۰۲۶۷	۰	۳۶۰۲۰	۲۵۰۰	۱۵۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

خرید و اجرای لوله های خط انتقال آب

عملیات اجرایی باقی مانده:

خرید و اجرای لوله پلی اتیلن و فولادی
اجرای آبگیری
احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ
خرید و نصب لوازم مکانیکال و الکتریکال
اجرای استخر ذخیره آب
اجرای شبکه برق
احداث حوضچه مکش



۶- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی دهنو کیار

محل اجرا	روستای دهنو شهرستان کیار						
مساحت طرح	۲۲۷ هکتار (ملی و مستثنیات: ۱۰۳ زراعی و ۱۲۴ باغی)						
کاربری	کشاورزی						
میزان مجوز آب	۶۰ لیتر بر ثانیه						
تعداد بهره بردار	۱۲۰ خانوار						
طول خط انتقال	۱۶۰۰ متر						
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۱ ایستگاه						
مختصات جغرافیایی محل آبیگری	X:471768 Y:3530363						
سال شروع پروژه	۱۳۹۸						
پیشرفت فیزیکی	۳۰ درصد						
ارتفاع کل پمپاژ	۲۳۹ متر						
شیوه آبیگری: به روش مستقیم - کانال (طول کانال ۹۰ متر)							
مشخصات ایستگاه پمپاژ							
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی و پلی اتیلن (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۱۶۰۰	۲۵۰	۶۰	۲۳۹	WKL	۲	۳۵۰



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۶۰۲۰۰	۰	۳۵۱۵۵	۴۵۰۰	۲۰۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

عملیات اجرایی باقی مانده:

خرید بخشی از لوله های خط انتقال
اجرای کانال آبیگر و حوضچه لجن گیر و دیوار ساحلی

تکمیل خرید و اجرای لوله های خط انتقال
احداث استخر ذخیره آب
احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ
خرید و نصب لوازم مکانیکال و الکتریکال
اجرای شبکه برق
احداث چاهک مکش و حوضچه آبیگر
تکمیل راه دسترسی



۷- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی سرتنگ لاغر

محل اجرا							روستای سرتنگ لاغر شهرستان کیار
مساحت طرح							۱۷۰ هکتار
کاربری							کشاورزی
میزان مجوز آب							۷۰ لیتر بر ثانیه
تعداد بهره بردار							۱۰۰ خانوار
طول خط انتقال							۵۶۰۰ متر
تعداد ایستگاه های پمپاژ							۳ ایستگاه
مختصات جغرافیایی محل آبیگری							X:473568 Y:3528939
سال شروع پروژه							۱۳۹۶
پیشرفت فیزیکی							۸۰ درصد
ارتفاع کل پمپاژ							۶۰۰ متر
شیوه آبیگری: آبیگری مستقیم با کانال انحرافی							
مشخصات ایستگاه پمپاژ							
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۱۶۰۰	۲۵۰	۷۰	۲۰۰	WKL	۱+۱	۴۰۰
ایستگاه شماره دو	۲۰۰۰	۲۵۰	۷۰	۲۰۰	WKL	۱+۱	۴۰۰
ایستگاه شماره سه	۲۰۰۰	۲۵۰	۷۰	۲۰۰	WKL	۱+۱	۴۰۰



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۴۰۰۳۳	۲۵۰	۱۰۸۳۸۳	۲۵۰۰	۲۵۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

عملیات اجرایی باقی مانده:

اجرای آبیگری
احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ
احداث حوضچه شیرآلات
احداث استخر ذخیره آب
احداث جاده دسترسی
احداث حوضچه شیرآلات
خرید و اجرای بخشی از خط انتقال آب
خرید و نصب لوازم مکانیکال

تکمیل خرید و نصب لوازم مکانیکال
خرید و نصب لوازم الکتریکال
اجرای شبکه برق
حوضچه مکش و چاهک جذبی
تکمیل استخر ذخیره آب
تکمیل اجرای خط انتقال



۸- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی گاوتوت

محل اجرا	روستای گاوتوت شهرستان کیار					
مساحت طرح	۳۵۰ هکتار					
میزان مجوز آب	۱۹۳ لیتر بر ثانیه					
ناربری	کشاورزی					
تعداد بهره بردار	۱۴۰ خانوار					
طول خط انتقال	۳۳۰۰ متر					
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۱ ایستگاه					
مختصات جغرافیایی محل آبیگری	X:466305 Y:3535189					
سال شروع پروژه:	۱۳۹۰					
پیشرفت فیزیکی	۸۵ درصد					
ارتفاع کل پمپاژ	۴۲۸ متر					
شیوه آبیگری: گالری زیر سطحی به شیوه جذبی						
مشخصات ایستگاه پمپاژ						
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ
ایستگاه شماره یک	۳۳۰۰	۴۰۰	۱۹۳	۴۲۸	شناور	۱۴
	۱۹۷۰					



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۵۰۰۵۶	۰	۱۷۵۷۵۵	۷۲۸۹	۴۰۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

عملیات اجرایی باقی مانده:

خرید لوله، الکترو پمپ های شناور
خرید بخشی لوازم مکانیکال (شیرآلات و اتصالات)،
اجرای احداث گالری و حوضچه مکش
احداث جاده دسترسی و تعریض جاده
اجرای خط انتقال
احداث استخر انتهایی و دیوار ساحلی
اجرای بازسازی جاده دسترسی
اجرای ساختمان تابلو و نگهداری
احداث ساختمان ایستگاه و محوطه

خرید لوازم مکانیکال
خرید لوازم الکتریکال
نصب پمپ ها و لوازم مکانیکال
اصلاحات آبیگری
اجرای شبکه برق و ساختمان پست برق
خرید اتصالات چاهک مکش و حوضچه
رسوبگیری
تکمیل زیرساخت و لوله گذاری
تکمیل استخر



۹- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی کوگانک

محل اجرا	روستای کوگانک شهرستان کوهرنگ						
مساحت طرح	۱۴۰ هکتار						
کاربری	کشاورزی						
میزان مجوز آب	۸۰ لیتر بر ثانیه						
تعداد بهره بردار	۱۶۰ خانوار						
طول خط انتقال	۱۲۰۰ متر						
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۱ ایستگاه						
مختصات جغرافیایی محل آبگیری	X:438150 Y:3599679						
سال شروع پروژه :	۱۳۹۲						
پیشرفت فیزیکی	۵۰ درصد						
ارتفاع کل پمپاژ	۱۱۰ متر						
شیوه آبگیری :							
مشخصات ایستگاه پمپاژ							
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۱۲۰۰	۳۰۰	۸۰	۱۱۰			



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۰۰۹۲۴	۳۳۰۸	۳۲۴۸۳	۱۱۱۹۵	۵۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

عملیات اجرایی باقی مانده:

احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ
خرید و اجرای لوله های خط انتقال
احداث شبکه برق

تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ
تکمیل خرید و اجرای لوله های خط انتقال
احداث استخر ذخیره آب
اجرای شبکه برق
اجرای خط انتقال آب



۱۰- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی گزستان

محل اجرا							روستای گزستان شهرستان کوهرنگ
مساحت طرح							۱۲۵ هکتار
کاربری							کشاورزی
میزان مجوز آب							۱۱۵ لیتر بر ثانیه
تعداد بهره بردار							۲۱۵ خانوار
طول خط انتقال							۵۳۰ متر
تعداد ایستگاه های پمپاژ							۱ ایستگاه
مختصات جغرافیایی محل آبیگری							X: 417390 Y: 3552432
سال شروع پروژه :							۱۳۹۴
پیشرفت فیزیکی							۷۰ درصد
ارتفاع کل پمپاژ							۱۱۸ متر
شیوه آبیگری: احداث گالری							
مشخصات ایستگاه پمپاژ							
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۵۳۰	۳۰۰	۱۱۵	۱۱۸	شافت و غلاف	۲	



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۴۰۴۳۲	۱۱۰۱	۳۸۳۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

عملیات اجرایی باقی مانده:

تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ
احداث گالری آبیگری
خرید و اجرای لوله های خط انتقال
اجرای شبکه برق

تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ
تکمیل خرید و اجرای لوازم مکانیکال و الکتریکال
احداث استخر ذخیره آب
اجرای خط انتقال آب



۱۱- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی مالک آباد

محل اجرا	روستای مالک آباد شهرستان کوهرنگ
مساحت طرح	۱۲۵ هکتار
کاربری	کشاورزی
میزان مجوز آب	۷۷ لیتر بر ثانیه
تعداد بهره بردار	۲۱۵ خانوار
طول خط انتقال	۳۵۰۰ متر
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۱ ایستگاه
مختصات جغرافیایی محل آبگیری	X:431898 Y: 3560175
سال شروع پروژه:	۱۳۹۷
پیشرفت فیزیکی	۳۰ درصد
ارتفاع کل پمپاژ	۳۰۰ متر

شیوه آبگیری: آبگیری مستقیم (احداث بند و کانال)

مشخصات ایستگاه پمپاژ

نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله فولادی (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۳۵۰۰	۳۰۰	۷۷	۳۰۰	شناور	۳	-



کد پروژه	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۶۰۵۲۸	۰	۱۱۹۳۹	۶۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

خرید و اجرای لوله های خط انتقال
احداث استخر ذخیره آب



عملیات اجرایی باقی مانده:

تکمیل خرید و اجرای لوله های خط انتقال
تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ
تکمیل استخر ذخیره آب
احداث بند آبگیر
خرید و نصب لوازم مکانیکال و الکتریکال
خرید امتیاز برق و اجرای شبکه برق
تکمیل حوضچه آبگیر



۱۲- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی بوگر

محل اجرا	روستای بوگر شهرستان خاتمیرزا						
مساحت طرح	۲۵۰ هکتار						
دری	کشاورزی						
میزان مجوز آب	۱۲۰ لیتر بر ثانیه						
تعداد بهره بردار	۱۷۰ خانوار						
طول خط انتقال	۵۷۰۰ متر						
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۲ ایستگاه						
مختصات جغرافیایی محل آبیگری	X:474815 Y:3502791						
سال شروع پروژه	۱۳۹۰						
شرف فیزیکی	۸۰ درصد						
ارتفاع کل پمپاژ	۳۳۰ متر						
شیوه آبیگری: آبیگری مستقیم با کانال انحرافی							
مختصات ایستگاه پمپاژ							
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۳۶۰۰	۳۵۰	۱۰۰	۱۵۶	شافت و غلاف	۲	۱۶۰
ایستگاه شماره دو	۲۱۰۰	۳۵۰	۱۰۰	۱۷۴	wkl	۲	۳۱۵



عملیات اجرایی انجام شده:

احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ شماره یک
خرید و اجرای لوله های خط انتقال آب
احداث استخرهای ذخیره آب
احداث حوضچه شیرآلات
خرید و نصب لوازم مکانیکال

عملیات اجرایی باقی مانده:

تکمیل خرید و نصب لوازم مکانیکال
خرید و نصب لوازم الکتریکی
خرید امتیاز برق و اجرای شبکه برق
تکمیل حوضچه آبیگر



۱۳- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی گرداب سفلی

محل اجرا	روستای گرداب سفلی شهرستان فلارد
مساحت طرح	۳۰۰ هکتار
کاربری	کشاورزی
میزان مجوز آب	۱۸۵ لیتر بر ثانیه
تعداد بهره بردار	۲۵۰ خانوار
طول خط انتقال	۵۰۰۰ متر
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۲ ایستگاه
مختصات جغرافیایی محل آبیگری	X:523903 Y:3454655
سال شروع پروژه	۱۳۸۸
پیشرفت فیزیکی	۸۰ درصد
ارتفاع کل پمپاژ	۲۹۳ متر

شیوه آبیگری: مستقیم با کانال انحرافی

مشخصات ایستگاه پمپاژ

نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	نوع پمپ	تعداد پمپ	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۲۲۰۰	۴۰۰	۱۰۰	۱۵۸	Wkl	۲	۱۶۰
ایستگاه شماره دو	۱۸۰۰	۳۵۰	۸۵	۱۳۵	wkl	۲	۱۶۰



کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز
۹۶۰۲۲۱	۰	۹۹۹۷۷	۱۱۶۸۰	۳۰۰۰۰۰

عملیات اجرایی انجام شده:

احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ شماره یک
خرید و اجرای لوله های خط انتقال آب
اجرای آبیگری
احداث استخرهای ذخیره آب
احداث حوضچه شیرآلات
خرید و نصب لوازم مکانیکال

عملیات اجرایی باقی مانده:

تکمیل خرید و نصب لوازم مکانیکال
خرید و نصب لوازم الکتریکی
خرید و اجرای شبکه برق



۱۴- طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی سرچاه و دوازده امام

محل اجرا	روستای سرچاه و دوازده امام شهرستان اردل				
مساحت طرح	۶۰۰ هکتار				
کاربری	کشاورزی				
میزان مجوز آب	۳۶۶ لیتر بر ثانیه				
تعداد بهره بردار	۴۰۰ خانوار				
طول خط انتقال	۴۶۵۰ متر				
تعداد ایستگاه های پمپاژ	۲ ایستگاه				
مختصات جغرافیایی محل آبگیری	X:458216 Y:3538305				
سال شروع پروژه	۱۳۹۰				
پیشرفت فیزیکی	۲۰ درصد				
ارتفاع کل پمپاژ	۵۹۸ متر				
شیوه آبگیری: آبگیری مستقیم با کانال انحرافی					
مشخصات ایستگاه پمپاژ					
نام ایستگاه	طول خط (متر)	سایز لوله (میلیمتر)	دبی (لیتر بر ثانیه)	اختلاف ارتفاع (متر)	میزان برق مصرفی (کیلووات)
ایستگاه شماره یک	۱۷۴۶	۶۰۰	۳۶۶	۲۶۷	۱۸۰۰
ایستگاه شماره دو-سرچاه	۱۶۵۶	۵۰۰	۲۰۶	۲۵۰	۱۰۴۰
ایستگاه شماره دو-دوازده امام	۱۲۴۸	۳۵۰	۱۰۰	۸۰	۷۸۰



عملیات اجرایی انجام شده:

خرید و اجرای قسمتی از لوله های خط انتقال
احداث جاده دسترسی



عملیات اجرایی باقی مانده:

تکمیل خرید و اجرای خط های انتقال
اجرای آبگیر
احداث ساختمان ایستگاه های پمپاژ
احداث استخرهای ذخیره آب
حوضچه های مسیر
خرید و نصب لوازم مکانیکال و الکتریکال
خرید و اجرای شبکه برق



طرح تکمیل زیر ساخت مجتمع شیلاتی به شماره طبقه ۰۱ چ ۰۵ ۱۳۰۶۰۰۵

کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳
۹۶۰۲۵۱	۰	۳۲۴۲۵	۲۲۱۰۹

عنوان پروژه	عملیات انجام شده	عملیات باقی مانده	شهرستان	ظرفیت پروژه
تکمیل شبکه برق رسانی به مزارع پرورش ماهی شمس آباد	احداث شبکه برق رسانی	تکمیل شبکه برق رسانی و خرید تجهیزات مربوطه	بروجن	



طرح تکمیل زیر ساخت مجتمع شیلاتی به شماره طبقه ۰۰۱ چ ۰۵ ۱۳۰۶۰۰

کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)
۸۶۰۶۶۰	۱۲۲۶۷	۷۱۳۶۱	۱۹۳۰۱	۲۵۰


عنوان پروژه	عملیات انجام شده	عملیات باقی مانده	شهرستان	اشتغال (نفر)	ظرفیت پروژه
تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع ماهیان سردابی هلم	تکمیل پایه های دو طرف پل	تکمیل دستک های دو طرف پل و اجرای عرشه پل	کیار	۴۵	۴۵۰



طرح تکمیل زیر ساخت مجتمع شیلاتی به شماره طبقه ۰۰۱ چ ۰۵ ۱۳۰۶۰۰

کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳
۹۶۰۲۵۲	۰	۱۷۴۰۸	۷۹۷۴


عنوان پروژه	عملیات انجام شده	عملیات باقی مانده	شهرستان	ظرفیت پروژه
تکمیل زیرساخت های مجتمع شیلات چم سور و تبرک	احداث کانال ورودی و سربندها	تکمیل کانال ورودی و سربندها	کوهرنگ	

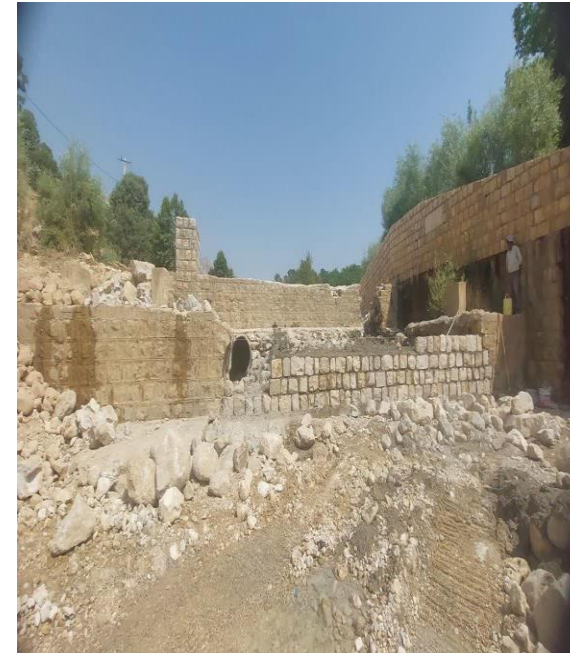

طرح تکمیل زیر ساخت مجتمع شیلاتی به شماره طبقه ۰۰۱ چ ۰۵ ۱۳۰۶۰۰

کد پروژه	اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اعتبار سال ۱۴۰۳
۹۶۰۲۵۳	۰	۱۱۷۳۷	۳۳۵۸

عنوان پروژه	عملیات انجام شده	عملیات باقی مانده	شهرستان	ظرفیت پروژه
تکمیل زیرساخت های مجتمع آبی پروری افسرآباد	احداث کانال ورودی، احداث شبکه برق	تکمیل کانال ورودی، خشکه چینی کانال، ترمیم سربند و دیوار حائل		

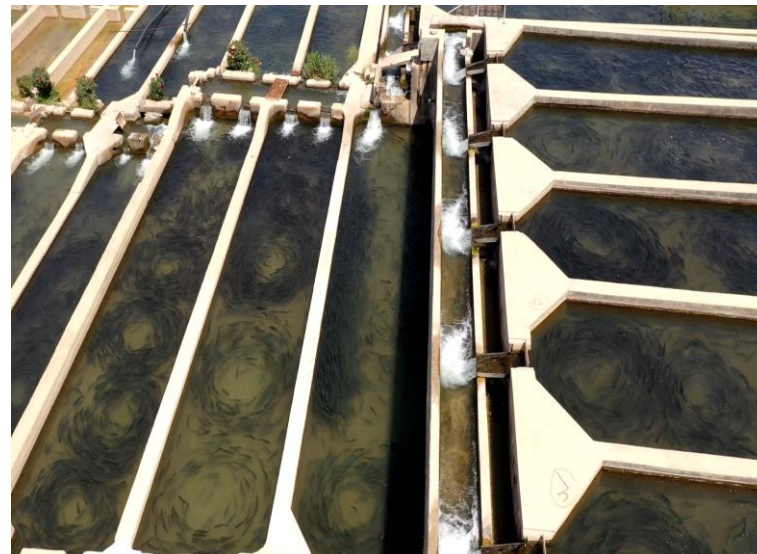

طرح احیاء و مرمت قنوات به شماره طبقه ۶۰۰ چ ۶۰۰ ۱۳۰۷۰۰۶

اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	رشته	اعتبار سال ۱۴۰۳	
۱۶,۰۶۹	۲۵۴,۱۹۳	۸۴۱	۱۲۸۴۰۶	

شهرستان	کد پروژه	اعتبار هزینه شده	تعداد رشته	طول قنوات	تعداد میله چاه	سطح اراضی زیر دست	تعداد مالکین
شهرکرد	۹۰۰۹۱۴	۵۰,۸۶۵	۲۵۴	۱۰۷,۹۵۴	۴,۰۷۴	۱۵,۲۶۴	۱۱,۳۳۵
بروجن	۹۰۰۹۱۵	۶۵,۵۰۲	۱۱۶	۹۱,۶۶۷	۴,۶۱۰	۸,۵۷۲	۹,۶۸۷
فارسان	۹۰۰۹۱۶	۴,۴۶۲	۱۱	۲,۸۱۸	۱۴۶	۷۵۳	۴۵۴
لردگان	۹۰۰۹۱۸	۳۷,۳۶۲	۹	۵,۱۵۵	۲۱۸	۱۹۳	۷۶۰
اردل	۹۰۰۹۱۷	۹,۵۸۳	۳۳	۲,۸۷۰	۱۸۹	۳۷۱	۵۴۵
کیار	۹۰۰۹۲۰	۳۱,۱۴۷	۳۴	۱۶,۵۳۵	۶۳۶	۱,۲۲۶	۹۶۷
سامان	۹۲۰۲۰۸	۲۴,۶۳۳	۱۵۵	۸۴,۸۲۹	۲,۳۹۸	۳,۲۴۴	۵,۳۹۳
فلارد	۴۰۲۰۰۳۲	۲,۴۴۵	۱۵	۳,۱۲۵	۸۶	۶۱۰	۱,۵۵۹
فرخ شهر	۴۰۳۰۴۱۴	۰	۶۴	۶۲,۶۴۸	۲,۵۳۴	۷,۲۰۰	۲,۲۹۹
خانمیرزا	۴۰۰۰۰۳۳	۱۸,۶۰۰	۳۳	۶,۹۳۵	۳۳۷	۵۱۹	۳۴۳
بن	۹۲۰۲۰۷	۲۷,۸۴۵	۱۰۳	۴۸,۲۲۷	۱۱,۸۱۶	۶,۵۴۰	۳,۶۶۴
جمع		۲۷۲,۴۴۴	۸۲۷	۴۳۲,۷۶۳	۲۷,۰۴۴	۴۴,۴۹۲	۳۷,۰۰۶

تصاویر طرح احیاء و مرمت قنوات به شماره طبقه ۶۰۰ چ ۶۰۰۷۰۰۶۱۳۰



طرح احداث، تکمیل و بهسازی کانال های آبرسانی کشاورزی و انتقال آب با لوله به شماره طبقه ۴۰۰ چ ۱۲.۰۶.۱۳۰

اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	اهداف (کیلومتر)	اعتبار سال ۱۴۰۳
۵۱,۶۹۱	۷۵۱,۴۷۲	۵۷۶	۵۹۹۰۱۵

شهرستان	اهداف (کیلومتر)	کد پروژه	اعتبار هزینه شده	تحقق (کیلومتر)	اعتبار مورد نیاز
شهرکرد	۴۵	۹۰۰۹۰۷	۵۶,۶۹۳	۱۸	۳۲۴,۰۰۰
بروجن	۱۳۵	۹۰۰۹۰۸	۴۱,۲۸۹	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
فارسان	۵۰	۹۰۰۹۰۹	۹۸,۲۹۶	۱۵	۴۲۳,۶۰۰
لردگان	۶۰	۹۰۰۹۱۰	۱۳۳,۵۳۴	۲۰	۴۸۲,۴۰۰
اردل	۵۳	۹۰۰۹۱۱	۶۵,۰۳۶	۱۵	۴۵۶,۰۰۰
کوهرنگ	۲۸	۹۰۰۹۱۲	۱۰۰,۵۱۴	۱۸	۱,۲۳۶,۰۰۰
کیار	۲۴	۹۰۰۹۱۳	۷۸,۷۱۵	۱۳	۱۳۲,۰۰۰
سامان	۴۳	۹۲۰۴۰۷	۱۸,۲۸۴	۴	۴۶۸,۰۰۰
بن	۴۳	۹۲۰۴۰۶	۳۵,۵۴۲	۲۳	۲۳۸,۸۰۰
خانمیرزا	۴۰	۹۹۰۱۹۶	۳۶,۵۹۷	۴	۴۳۴,۴۰۰
فلارد	۴۰	۴۰۲۰۰۳۵	۱۹,۸۰۳	۲	۴۵۸,۴۰۰
فرخ شهر	۱۵	۴۰۳۰۴۱۲	۰	۲	۱۵۶,۰۰۰
جمع	۵۷۶		۶۸۴,۳۰۳	۱۴۴	۶,۳۰۹,۶۰۰

تصاویر طرح احداث، تکمیل و بهسازی کانال های آبرسانی کشاورزی به شماره طبقه ۴۰۰ چ ۱۲۰۶۰۱۳



توسعه گلخانه ها واحداث مجتمع های گلخانه ای



وضعیت موجود گلخانه های به بهره برداری رسیده استان به تفکیک محصول تاکنون

نوع کشت محصول	سطح زیر کشت (هکتار)
گلخانه های سبزی و صیفی	۸۵
گلخانه گل شاخه بریده	۲۰
جمع کل	۱۰۵

گلخانه های در دست اجرا	سطح (هکتار)
گندمان	۲۷/۹
بلداجی	۱۸
گردان	۲۱/۷
قارچ جونقان	۱۱/۱
نقنه ۱	۲۰

صدور ۷۰۰ فقره پروانه تاسیس گلخانه به مجموع مساحت ۳۰۰ هکتار

طرح ساماندهی گلخانه ها و احداث مجتمع های گلخانه ای به شماره طبقه ۳۰۰ چ ۹۰۰۶۰۱۳۰

اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	سطح (هکتار)	اعتبار سال ۱۴۰۳
۰	۲۸۴۱۴	۱۱/۱	۰

عنوان پروژه	عملیات انجام شده	عملیات باقی مانده	شهرستان	ظرفیت پروژه
تکمیل ایجاد زیر بناهای مجتمع گلخانه ای و قارچ جونقان فارس	خرید و نصب لوازم گاز رسانی، خرید و نصب لوازم برق، حفر چاه و احداث استخر ذخیره آب، خرید ایستگاه تقلیل فشار گاز	واگذاری به شرکت شهرک ها	فارس	۲۷ واحد ۵۰۰۰ متر مربعی و یک واحد ۱۰۰۰۰ متر مربعی



طرح ساماندهی گلخانه ها واحداث مجتمع های گلخانه ای به شماره طبقه ۳۰۰ چ ۹۰۰۶۰۱۳

اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	سطح (هکتار)	اعتبار سال ۱۴۰۳
۰	۳۶۱۳۳	۱۸	۰

عنوان پروژه	عملیات انجام شده	عملیات باقی مانده	شهرستان	ظرفیت پروژه
تکمیل ایجاد زیر بناهای مجتمع گلخانه ای بلداجی بروجن	خرید و نصب لوازم گاز رسانی، خرید و نصب لوازم برق، حفر چاه و احداث استخر ذخیره آب، خرید ایستگاه تقلیل فشار گاز	واگذاری به شرکت شهرک ها	بروجن	۱۸ واحد ۴۰۰۰ متر مربعی و یک واحد ۲۰۰۰ متر مربعی



طرح سامانه نوین آبیاری به شماره طبقه ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸


اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	هدف (هکتار)	اعتبار سال ۱۴۰۳	
۰	۱۴۳۷۱۴۰	۱۰۰۸۰	۰	سالی ۱۶۸۰ هکتار

عنوان پروژه	عملیات انجام شده	عملیات باقی مانده	شهرستان
شبکه نوین آبیاری	۱۱۴۸۳	۰	کل استان



طرح حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار به شماره طبقه ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۸

اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	هدف (هکتار)	اعتبار سال ۱۴۰۳
۰	۴۹۱۸۴۹	توسعه ۷۰۰ هکتاری باغات در اراضی شیبدار و ۳۰۰ هکتاری کشت گیاهان دارویی	۳۷۲۹۸

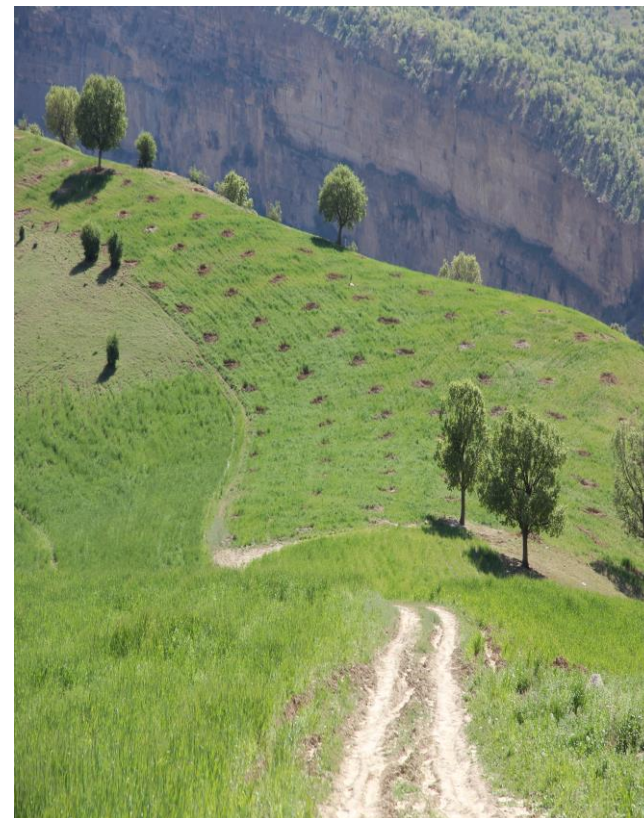

طرح ایجاد زیر ساخت مجتمع دامپروری به شماره طبقه ۲۰۰ چ ۱۳۰۶۰۱

اعتبار هزینه شده قبل از برنامه ششم	اعتبار هزینه شده در طول برنامه ششم	تعداد مجتمع	اعتبار سال ۱۴۰۳
۲۵,۰۲۱	۱۰۲,۷۲۳	۱۹	۳۸,۹۴۵

شهرستان	تعداد مجتمع	اعتبار هزینه شده	لیست مجتمع ها	ظرفیت (راس)
شهرکرد	۶	۴۵,۷۵۲	ماه بانو شهر کیان - شاه منظر - شورابچه - حاجکوها شمالی و جنوبی - اسکان - قلنگان	۵۷,۵۳۰
بروجن	۴	۳۳,۱۰۷	بروجن - بلداجی - گندمان - فرادنبه - سفید دشت	۱۰,۲۶۰
فارسان	۲	۵,۸۶۳	مطالعه و اجرای طرح توسعه دام سبک و سنگین فارسان - مجتمع دامپروری جوققان	۱,۷۹۰
لردگان	۱	۴,۴۲۹	مجتمع دامپروری میلاس لردگان	۱,۳۲۵
اردل	۲	۵,۴۵۵	مطالعات و اجرای طرح تجمیع دام سبک و سنگین اردل - صالحیان اردل	۳۰۰
کیار	۱	۴,۵۵۳	مطالعات و اجرای طرح تجمیع دام سبک و سنگین در سطح شهرستان کیار	
کوهرنگ	۱	۳,۱۲۳	مطالعه و ایجاد مجتمع دامپروری کوهرنگ - تکمیل مجتمع دامپروری دشت زرین	
سامان	۱	۱,۰۰۰	تکمیل مجتمع دام سامان	
فلارد	۱	۲,۹۲۱	مطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمع دامپروری شهرستان فلارد	
فرخ شهر	۱	۱,۷۸۴	دهک فرخ شهر	۱,۱۶۰
خانمیرزا	۲	۴,۲۲۰	ایجاد زیربناهای مجتمع دامپروری بابا منصور - مطالعه و اجرای طرح توسعه دام سبک و سنگین	
بن		۱۰,۴۵۱	مجتمع دامپروری شیدای بن	۴,۷۰۰
جمع		۱۱۲,۲۰۷		

تصاویر طرح ایجاد زیر ساخت مجتمع دامپروری به شماره طبقه ۲۰۰ چ ۱۳۰۶۰۱



پروژه های در حال سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی

[illegible]

پروژه های مشارکت بخش خصوصی در اجراء طرح های آب و خاک استان

پروژه های پیشنهادی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی

[illegible]



از حسن توجه شما بی نهایت سپاسگزارم
